


A1



PRŠI KAŠTELA



Sadržaj

- Status projekta
- Prava i obveze iz Ugovora o korištenju bespovratnih sredstava:
 - A1 obveze uz prikaz rezultata projektiranja projekta
 - Obveze Kaštela
 - Zajedničke obveze
- Kontakti

Status Projekta

Cilj projekta:

- izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i bežičnim tehnologijama, te omogućavanje brzina >40 Mbit/s

Područje projekta:


- Grad Kaštela, Grad Trogir, Grad Split, Općina Lećevica, Općina Marina, Općina Okrug, Općina Prgomet, Općina Primorski Dolac te Općina Seget.

Osnovni parametri projekta:

- ukupno korisnika: 23.837
- ukupna vrijednost projekta: 113.518.607,23 kn
- EU udio u financiranju projekta: 51.561.847,93 kn
- trajanje: 31.07.2020.–15.10.2023.
- partner na projektu: Grad Kaštela

Status izvršenja projekta

1. Potpisan ugovor sa izvođačem za fiksnu mrežu (Konektor d.o.o.)
2. Priprema idejnog projekta i ishođenje potrebitih dozvola za glavni projekt
3. Početak gradnje fiksne mreže

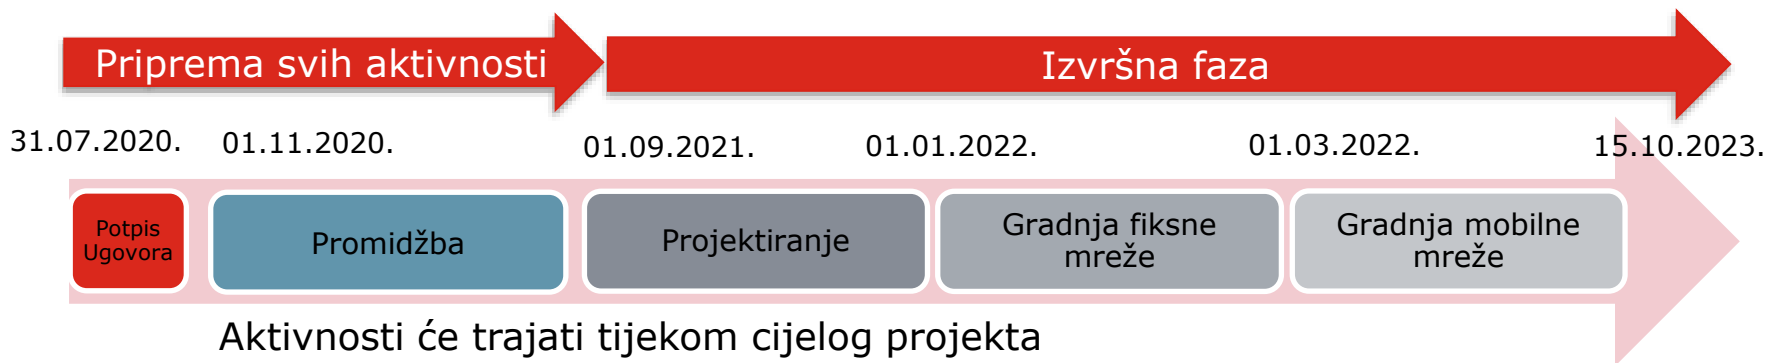

A1 će kontinuirano informirati Grad Kaštela o napredovanju cjelokupnog projekta


Obveze A1 Hrvatska

A1 je odgovoran za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu Projekta što podrazumijeva:

- projektiranje i izgradnju širokopojasne pristupne mreže uz postavljanje odgovarajuće opreme
- osiguranje da cjelokupna širokopojasna pristupna mreža bude dovedena u operativni status prije završetka provedbe projekta (15.10.2023.)
- osiguranje ljudskih, financijskih i materijalnih resursa za upravljanje i izvršenje projekta
- provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta kao i one vezane uz horizontalna načela
- osiguranje veleprodajnog pristupa širokopojasnoj pristupnoj mreži uz javnu objavu uvjeta prethodno odobrenih od HAKOM-a najmanje 6 mjeseci prije nego mreža postane operativna i to u razdoblju od najmanje 7 godina od trenutka u kojem cjelokupna mreža postane u potpunosti operativna

Rezultat projektiranja

- ukupno 23.837 korisnika obuhvaćeno projektom
- minimalno 20.520 korisnika (86%) pokriveno je FTTH mrežom
- 2 agregacijske točke
- 48 distribucijskih čvorova
- 56 naselja obuhvaćeno projektom
 - 28 naselja pokriveno u potpunosti FTTH mrežom
 - 19 naselja pokriveno u potpunosti mobilnom mrežom
 - 9 naselja pokriveno kombinacijom FTTH mreže i mobilne mreže

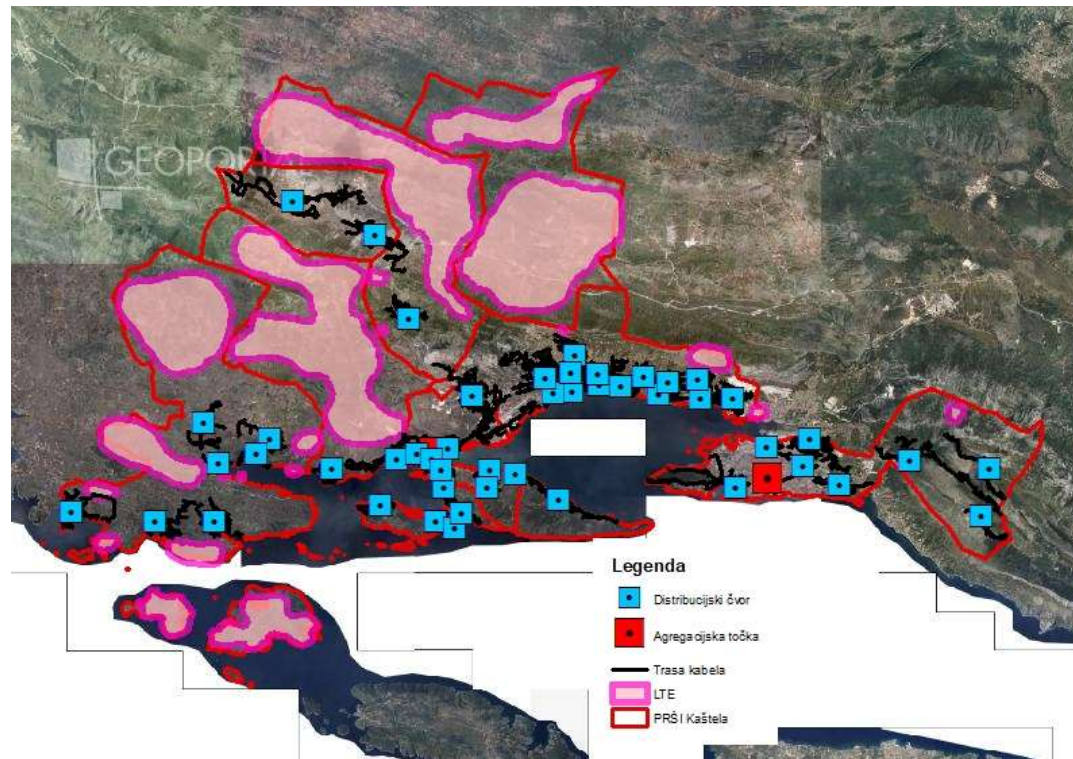

Obveze Grada Kaštela kao Nositelja projekta

- redovito pratiti i izvješćivati HAKOM (NOP) o svim pripremnim i provedbenim aktivnostima na projektu;
- čuvati sve dokaze o izvršenim plaćanjima i drugu dokumentaciju o projektu najmanje 7 godina od završetka projekta;
- A1 pružiti podatke i dokumentaciju potrebnu za pripremu i podnošenje redovitih financijskih i narativnih izvješća u zahtijevanom obliku i rokovima podnošenja te na zahtjev pripremati podatke za izradu dodatnih izvješća;
- sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati nepravilnosti u provedbi projekta;
- osigurati revizijski trag i čuvanje svih dokumenata koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga
- osigurati mogućnost nadzora korištenja sredstava od strane revizora i ostalih nadzornih tijela na razini Europske unije i Republike Hrvatske i postupati sukladno njihovim preporukama te o tome obavještavati PT2
- **podržati A1 u ishodu svih potrebnih dozvola iz domene prostornog uređenja i gradnje**
- neće ni na koji način ograničavati A1 u izvršavanju preuzetih obveza u izgradnji širokopojasne pristupne mreže

Neispunjavanje ugovornih obveza

- smatra se da Partner ne ispunjava svoje obveze ako ne izvršava zadaće definirane prijavljenim Projektnim prijedlogom, odnosno Sporazumom o partnerstvu, ako se u dva navrata u roku ne odazove na poziv Prijavitelja/Korisnika za slanjem određene dokumentacije, a najduže u roku od 30 dana ne pošalje traženu dokumentaciju.

Zajedničke obveze

- osigurati učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti
- tijekom razdoblja od 7 godina od završnog plaćanja po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (do 31.12.2030.) osigurati:
 - održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta, u skladu s uputama/preporukama proizvođača;
 - održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osiguralo ostvarenje ciljanih pokazatelja utvrđenih u Opisu i proračunu projekta (potpuna pokrivenost sa 30 odnosno 40/100 Mbit/s u području provedbe projekta)
 - da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti

Kontakti:

A1 Hrvatska

Direktor planiranja i razvoja mreže

- Vladimir Skender(vladimir.skender@a1.hr) ; 091 4691 830

Direktor odjela za izgradnju infrastrukture

- Silvestar Andrić(silvestar.andric@a1.hr) ; 091 4691 450

Voditelj planiranja fiksne mreže

- Jasmin Lipović(jasmin.lipovic@a1.hr) ; 091 4691 506

Tehnički koordinator

- Šime Radman(sime.radman@a1.hr) ; 091 4692 437

Konektor d.o.o.

Voditelj projekta

- Ivan Keran (ivan.keran@konektor.hr) ; 098/283-850

Projektant

- Martin Rogoznica (martin.rogoznica@konektor.hr) ; 098/1917-982

Kaštela JLS



A1



Hvala

